Bedarfsermittlung für das WDV-System mit EPS

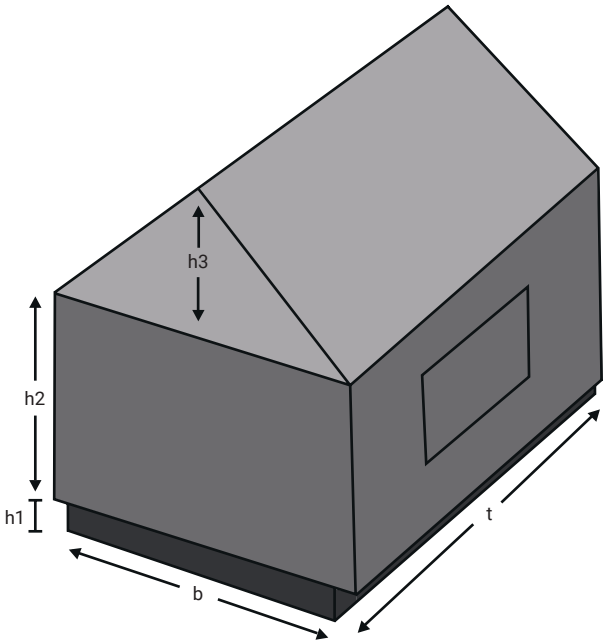

Flächenermittlung

h2 _____ x b _____ = _____ m²

h3 _____ x ½ b _____ = _____ m²

h2 _____ x t _____ = _____ m²

2 x _____ m²

Gesamt: _____ m²

Länge der Sockelabschlussprofile

2 x (b + t) = _____ m

Eckverstärkungen

4 x h2 = _____ m

1. Grundieren

Tiefgrund oder Aufbrennsperre ca. 200 ml / m²

0,20 l x _____ m² _____ l

2. Sockelabschluss

Sockelschiene 2,50 m / St.

Stärke: _____ _____ m

3. Dämmung

Polystyrol-Dämmplatte 1000 x 500 mm

Stärke: _____

WLG*: _____

Mineralwolle-Lamellenplatte 1200 x 200 mm
für Brandriegel

Stärke: _____

WLG*: _____ _____ m²

4. Kleben

VWS-Klebe- und Armierungsmörtel weiß/grau
ca. 5 kg / m²

5 kg x _____ m² = _____ kg

*Nach individuellem Bedarf: WDVS-Dübel, Eckverstärkungen, Anputzleisten, Diagonalarminierung, Fugendichtband oder sonstiges WDVS-Zubehör

5. Eckwinkel

Gewebeeckwinkel 2,50 m / St.

Abmessung: _____ _____ m

6. Armieren

VWS-Klebe- und Armierungsmörtel weiß/grau
ca. 5 kg / m²

5 kg x _____ m² = _____ kg

7. Gewebe

VWS-Gewebe ca. 1,10 m² / m²

1,10 m² x _____ m² = _____ m²

8. Putzgrundierung

Putzgrund ca. 300 g / m²

0,3 kg x _____ m² = _____ kg

9. Oberputz

Putz K3

4 kg / m² x _____ m² = _____ kg

Putz K2

2,8 kg / m² x _____ m² = _____ kg

Endbeschichtung

Egalisationsanstrich ca. 200 ml / m²

0,2 l x _____ m² = _____ l
